




Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02

Localisation des examens et avis géotechniques

23/11/2024



RÔLE		ENTREPRISE	ADRESSE	REPRÉSENTANT	TEL/FAX/M
1	Maître d'ouvrage	KAALA GOMEN	KAALA GOMEN	Pas de contact associé	
2	MOE	SARL BECK	BP 1845 98860 KONE	Pas de contact associé	

LOT		ENTREPRISE	ADRESSE	REPRÉSENTANT	TEL/FAX/M
LOT ST	HYDROSSEEDING	SOREVAS	Lot 189 - Secteur Pouembout lot B Pouembout	Mme Audrey MOLINA audrey.molina@sorevas.nc	Port. : 78.18.42
LOT 1	TERRASSEMENT	SARL AJ BOLLIET		M. Aymeric BUISSON abuisson@bolliet.nc	Port. : 751313


Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique / TC2 - PL35 - PK50060-52120

Liste des non-conformités

N°		LOT	ENTREPRISE	INTITULÉ	DATE BUTOIR	LOCALISATION	OBSERVATIONS	ÉTAT
211*		1 Maître d'ouvrage	KAALA GOMEN	Définir ou arrêter les travaux de la prochaine phase.	08/10/2024			À corriger


Plan - Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique / TC2 - PL35 - PK50060-52120

PLANCHE 35

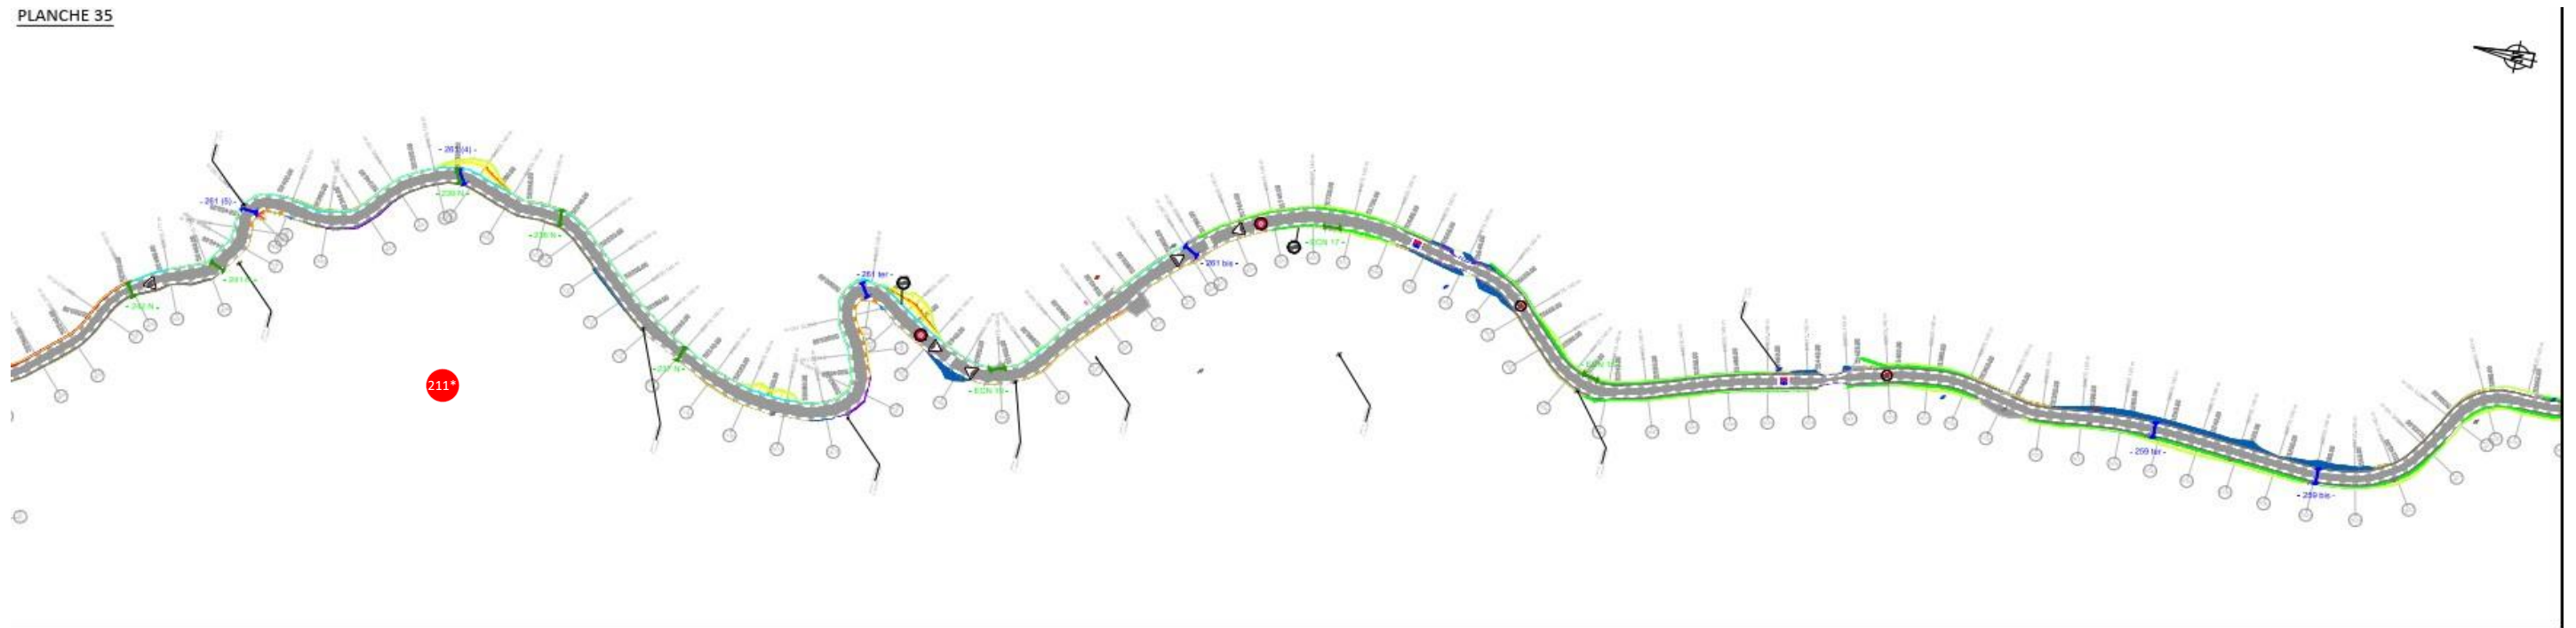


Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique / TC1.2 - PL41 - PK 59610-61010

Liste des non-conformités

N°		LOT	ENTREPRISE	INTITULÉ	DATE BUTOIR	LOCALISATION	OBSERVATIONS	ÉTAT
7	X	3 GEOTECHNICIEN		Zone de rétrécissement.	08/10/2024			À corriger
182*				Descente d’eau existante à reprendre	08/10/2024			À corriger
183*				Descente d’eau bétonnée existante à reprendre suite effondrement	08/10/2024			À corriger
184*				Exutoire de fossé à bétonner	08/10/2024			À corriger
185*				Zone en toit merlon à remplacer par des bordures de part et d’autre	08/10/2024			À corriger
186*				Exutoire de fossé à bétonner	08/10/2024			À corriger
187*				Forcer le dévers	08/10/2024			À corriger
188*				Ravine à gérer. Béton cyclopéen demandé	08/10/2024			À corriger
205*				Le poteau EEC n'a pas permis de terrasser convenablement au pied	08/10/2024			À corriger

Photographies des non-conformités

A photograph showing a dirt road that narrows significantly as it approaches a small tunnel entrance in a hillside. The road is flanked by steep, eroded earth banks. The sky is clear and blue.


7

Zone de rétrécissement.

3 GEOTECHNICIEN


Date butoir : 08/10/2024

Plan - Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique / TC1.2 - PL41 - PK 59610-61010

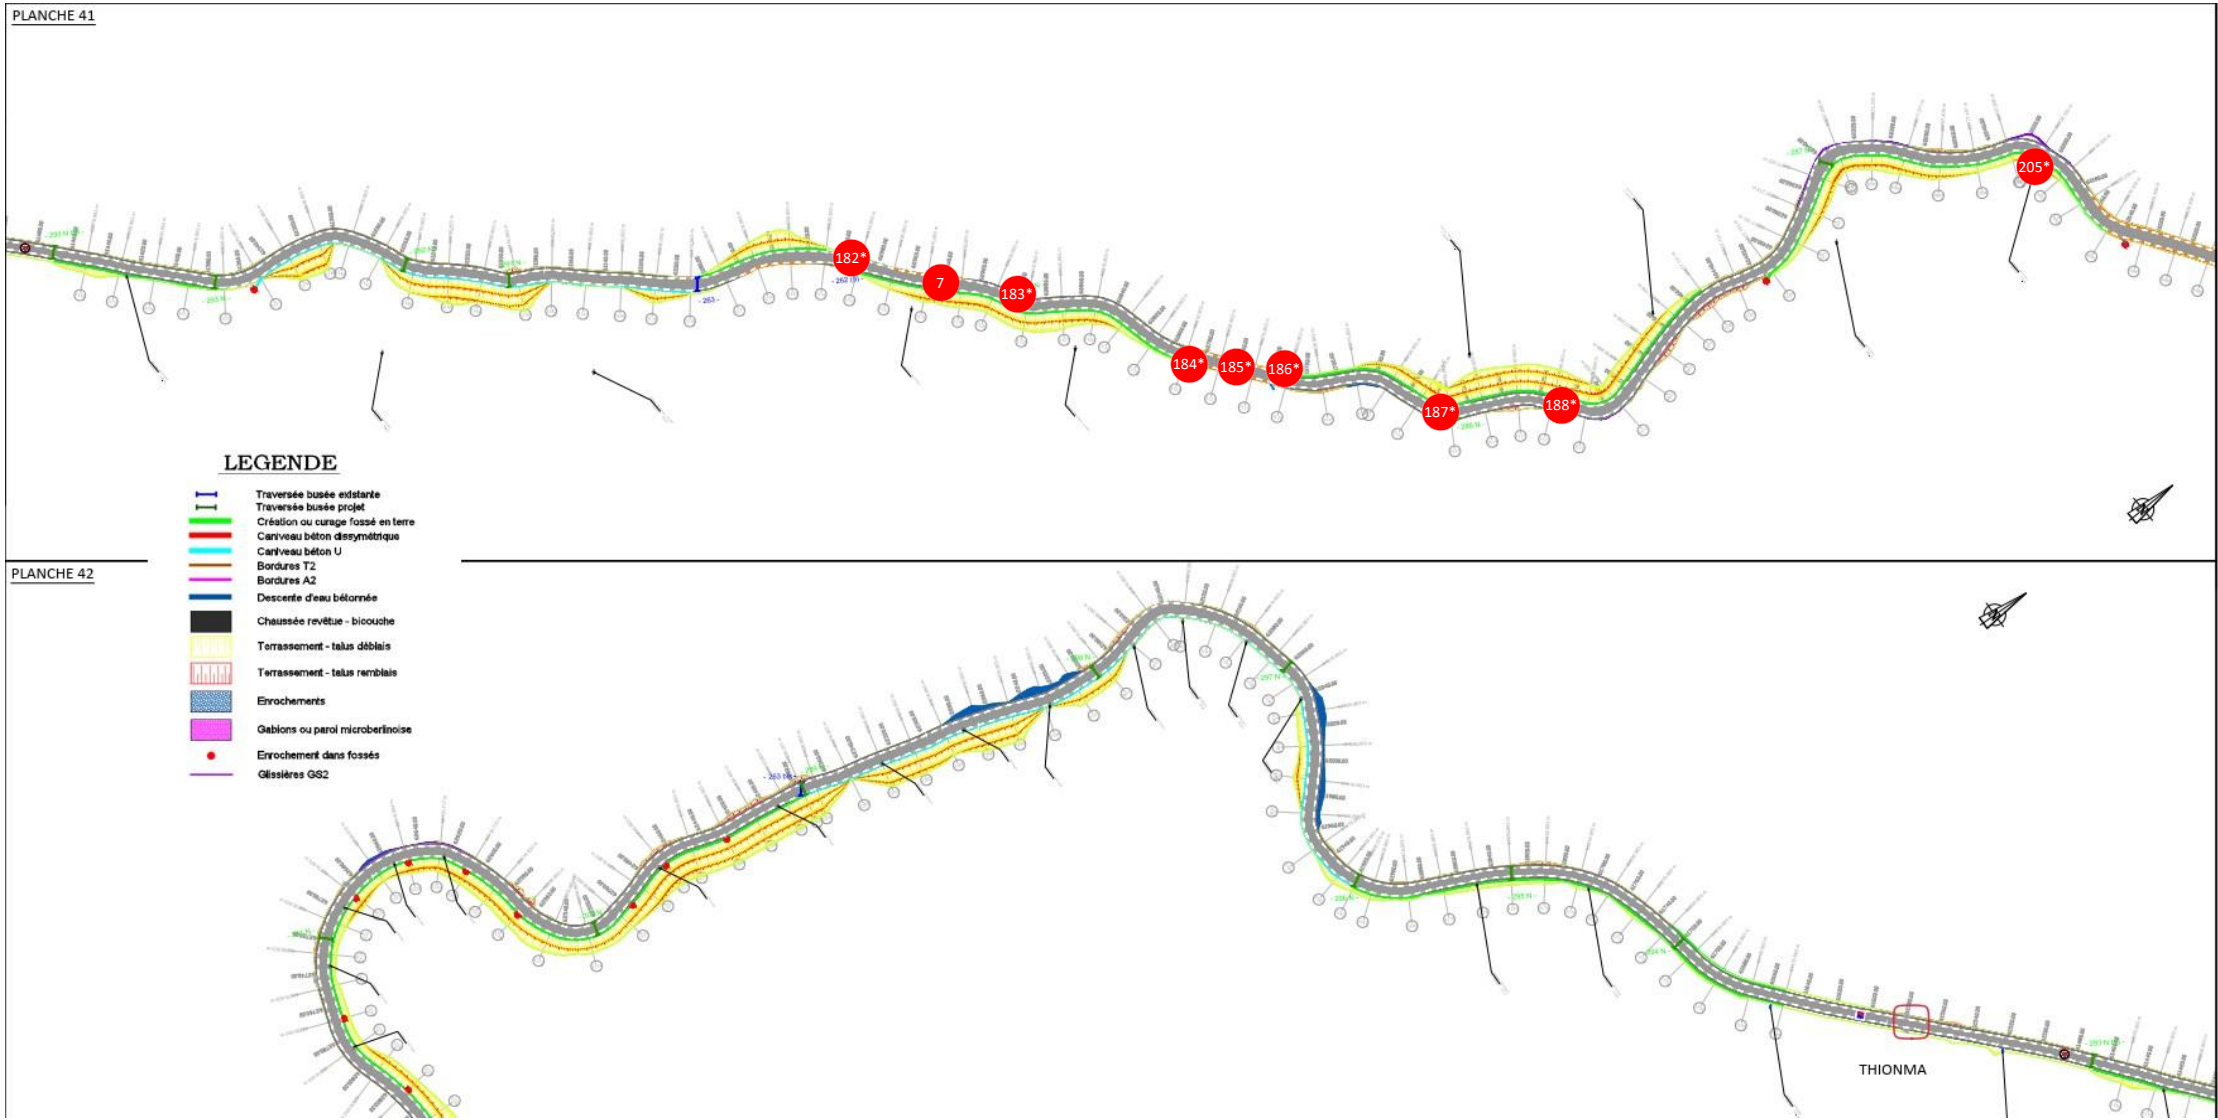

Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique / TF planche 4 - PK 56580-58030

Liste des non-conformités

N°		LOT	ENTREPRISE	INTITULÉ	DATE BUTOIR	LOCALISATION	OBSERVATIONS	ÉTAT
38		3 GEOTECHNICIEN		Avis sur enrochement CRV07	08/10/2024		Enrochement très raide. Assise non garantie.	À corriger
42	X	3 GEOTECHNICIEN		Confortement amont et aval à prévoir	08/10/2024		Fondation lignes elec déchaussée, largeur voirie insuffisante.	À corriger
43	X	3 GEOTECHNICIEN		Confortement amont et aval à prévoir	08/10/2024		P599-P606 CRV04 LGC - confortements à prévoir.	À corriger
141				Ravine à gérer. Béton cyclopéen demandé	08/10/2024			À corriger
142				Ravine à gérer. Béton cyclopéen demandé	08/10/2024			À corriger
143				Ravine à gérer. prévoir bordure	08/10/2024			À corriger
172*				Ravine à gérer. Béton cyclopéen demandé	08/10/2024			À corriger
194*				Zone en toit : prévoir des bordures pour éviter les ravines	08/10/2024			À corriger
208*				Sortie de fossé à bétonner	08/10/2024			À corriger
209*				Sortie de fossé à bétonner	08/10/2024			À corriger

Photographies des non-conformités



42

Confortement amont et aval à prévoir

3 GEOTECHNICIEN
Date butoir : 08/10/2024




43



Confortement amont et aval à prévoir

3 GEOTECHNICIEN
Date butoir : 08/10/2024

Plan - Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique / TF planche 4 - PK 56580-58030

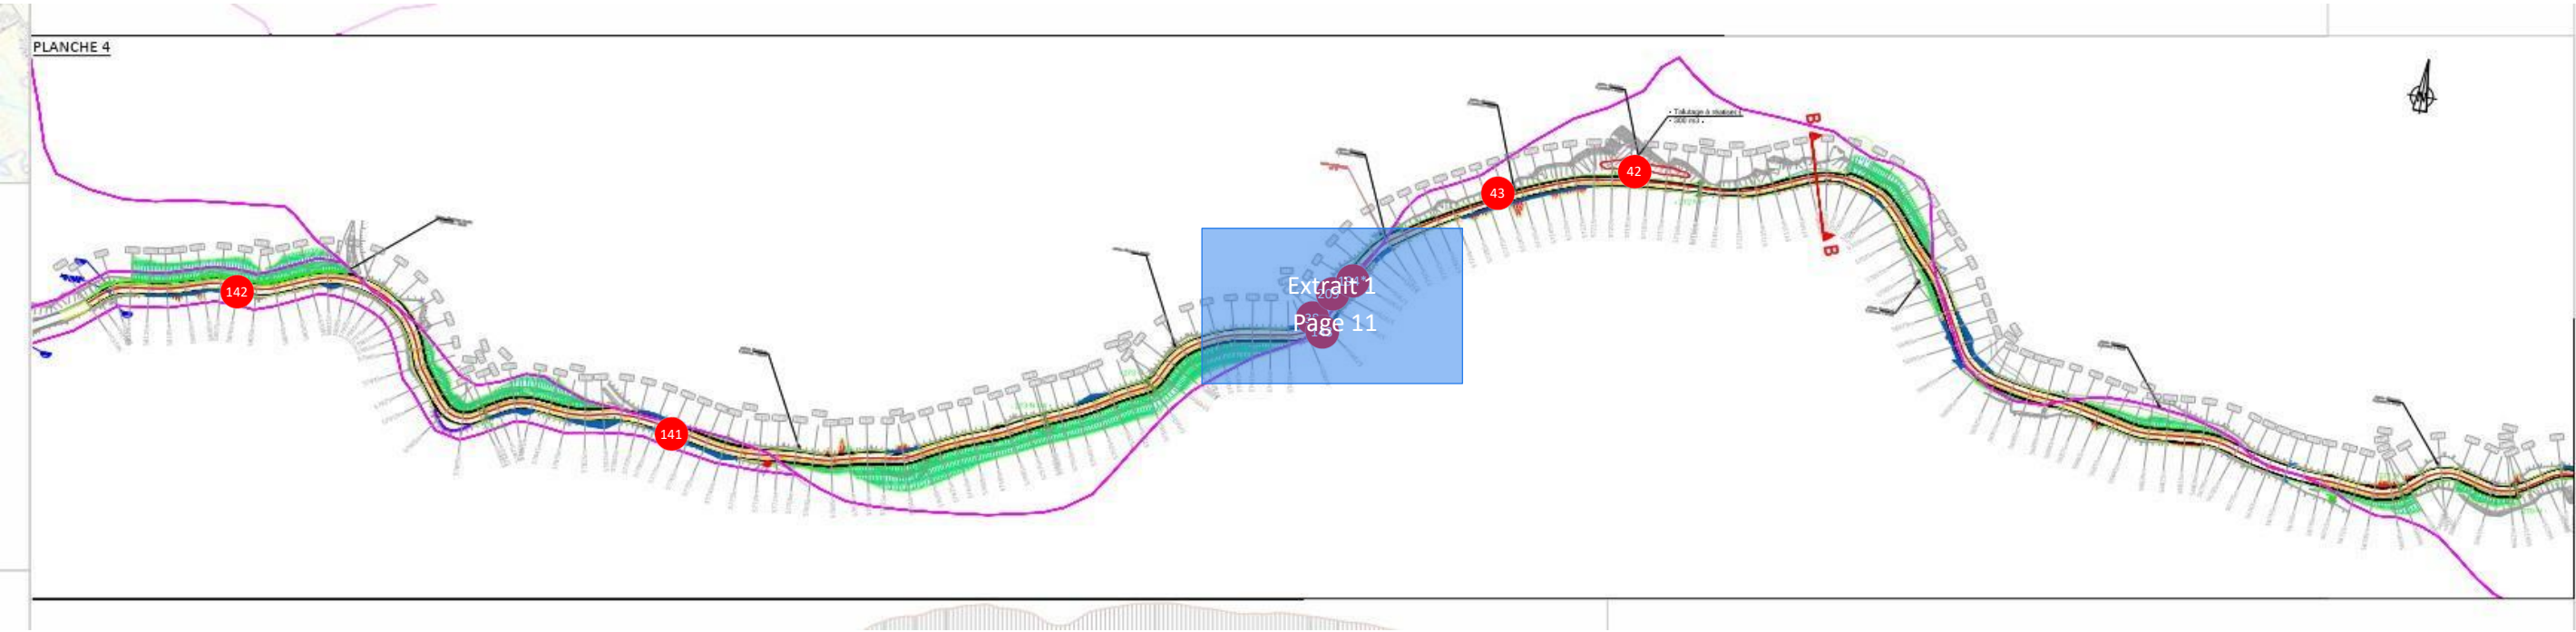

Plan - Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique /
TF planche 4 - PK 56580-58030 - Extrait 1

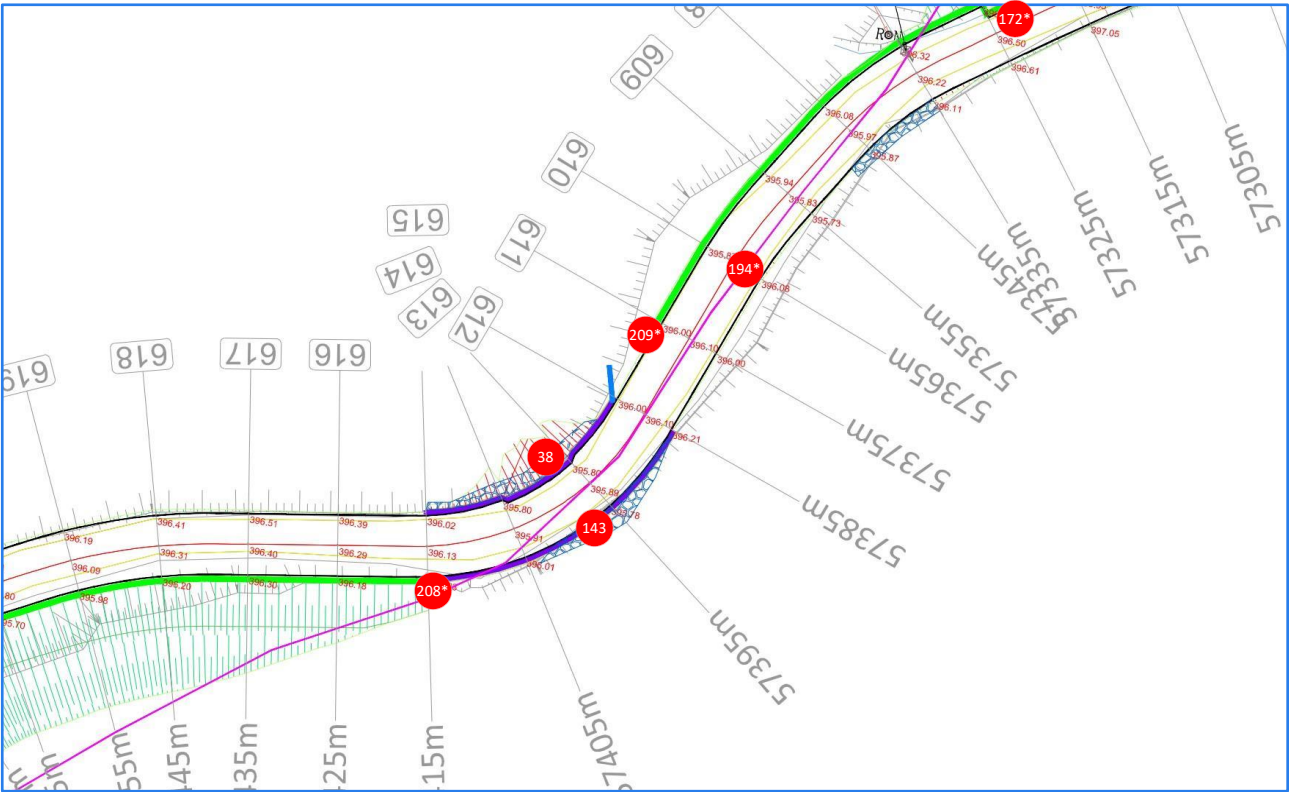

Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique / TF planche 3 - PK 55225-56580

Liste des non-conformités

N°		LOT	ENTREPRISE	INTITULÉ	DATE BUTOIR	LOCALISATION	OBSERVATIONS	ÉTAT
51		3 GEOTECHNICIEN		Talus très alétiéré suite effondrement.	08/10/2024			À corriger
52	X	3 GEOTECHNICIEN		Prévoir étude type grillage plaqué	08/10/2024			À corriger
54		3 GEOTECHNICIEN		Étude complémentaire à prévoir pour élargissement	08/10/2024			À corriger
56	X	3 GEOTECHNICIEN		Confortement amont à prévoir. Voir CRV6 qui préconise une G5	08/10/2024		Voir CRV6.	À corriger
57	X	3 GEOTECHNICIEN		Avis sur enrochement CRV07	08/10/2024		Doute sur l'assise.	Corrigée
63		3 GEOTECHNICIEN		Étude complémentaire à prévoir talus aval	08/10/2024			À corriger
64		3 GEOTECHNICIEN		Étude complémentaire à prévoir talus aval	08/10/2024	264n bis		À corriger
72		3 GEOTECHNICIEN		Avis sur enrochement CRV07. Caniveau bétonné : ok	08/10/2024	260 Nbis	Doute sur l'assise.	Corrigée
144	X	3 GEOTECHNICIEN		Ravine	22/11/2024			À corriger
166*				Descente d’eau bétonnée à finir	08/10/2024		266N	À corriger
167*				Fossé à finir	08/10/2024			À corriger
168*				Exutoire de fossé à finir	08/10/2024			À corriger
192*				Enrochement provisoire réalisé par BOLLIET pour permettre la circulation. Le MOE émet des réserves compte-tenu de l'ouvrage et des réserves du LBTP et de LGC. Prévoir un acrosol.	08/10/2024			À corriger
193*		3 GEOTECHNICIEN		Prévoir un confortement type acrosol P493-P498	08/10/2024			À corriger
204*		3 GEOTECHNICIEN		Avis G5 pour réalisation d'un enrochement suivant CRV05	08/12/2024			À corriger

Photographies des non-conformités



52

Prévoir étude type grillage plaqué

3 GEOTECHNICIEN
Date butoir : 08/10/2024



56

Confortement amont à prévoir. Voir CRV6 qui préconise une G5

3 GEOTECHNICIEN
Date butoir : 08/10/2024



57

Avis sur enrochement CRV07


3 GEOTECHNICIEN
Date butoir : 08/10/2024





144

Ravine
3 GEOTECHNICIEN
Date butoir : 22/11/2024



Plan - Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique / TF planche 3 - PK 55225-56580

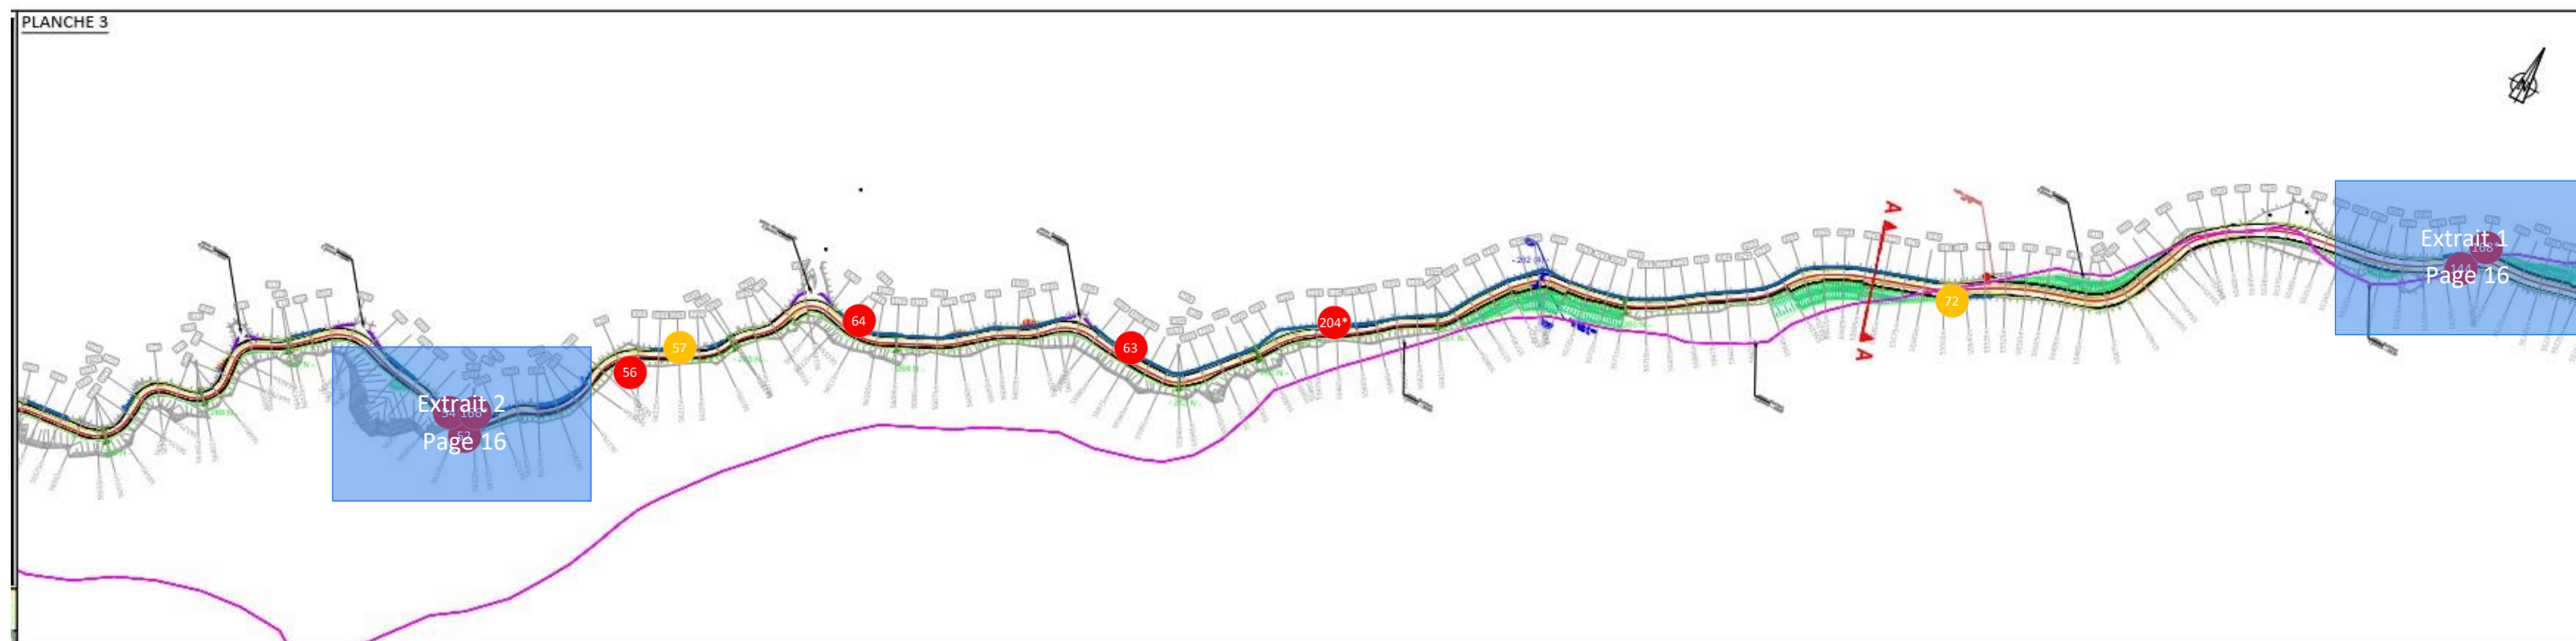

Plan - Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique /
TF planche 3 - PK 55225-56580 - Extrait 1

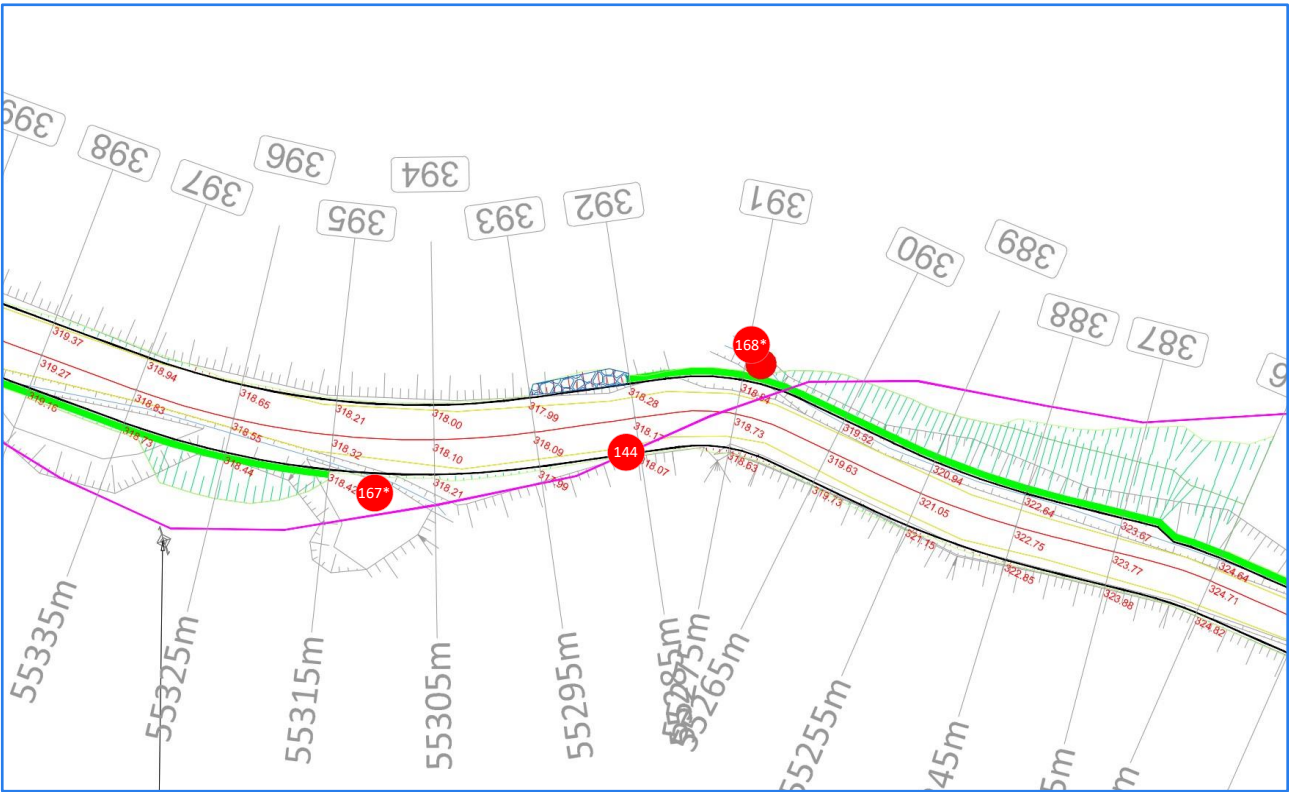


Plan - Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique /
TF planche 3 - PK 55225-56580 - Extrait 2

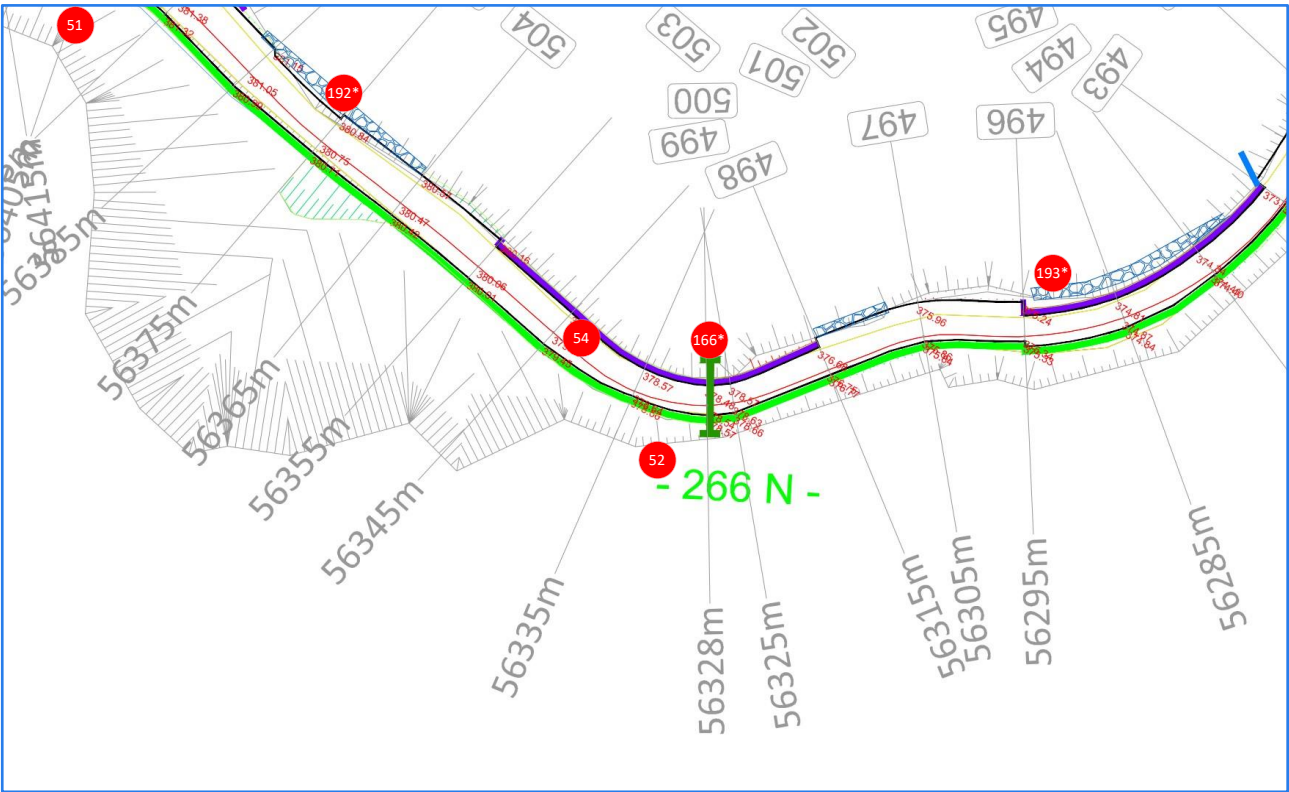


Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique / TF planche 2 - PK 53425-55225

Liste des non-conformités


N°		LOT	ENTREPRISE	INTITULÉ	DATE BUTOIR	LOCALISATION	OBSERVATIONS	ÉTAT
163*				Exutoire de fossé à finir.	18/10/2024		Suppression du bétonnage	À corriger
164*				Exutoire de fossé à faire	18/10/2024			À corriger
165*				Exutoire de fossé à faire	18/10/2024			À corriger

Plan - Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique / TF planche 2 - PK 53425-55225

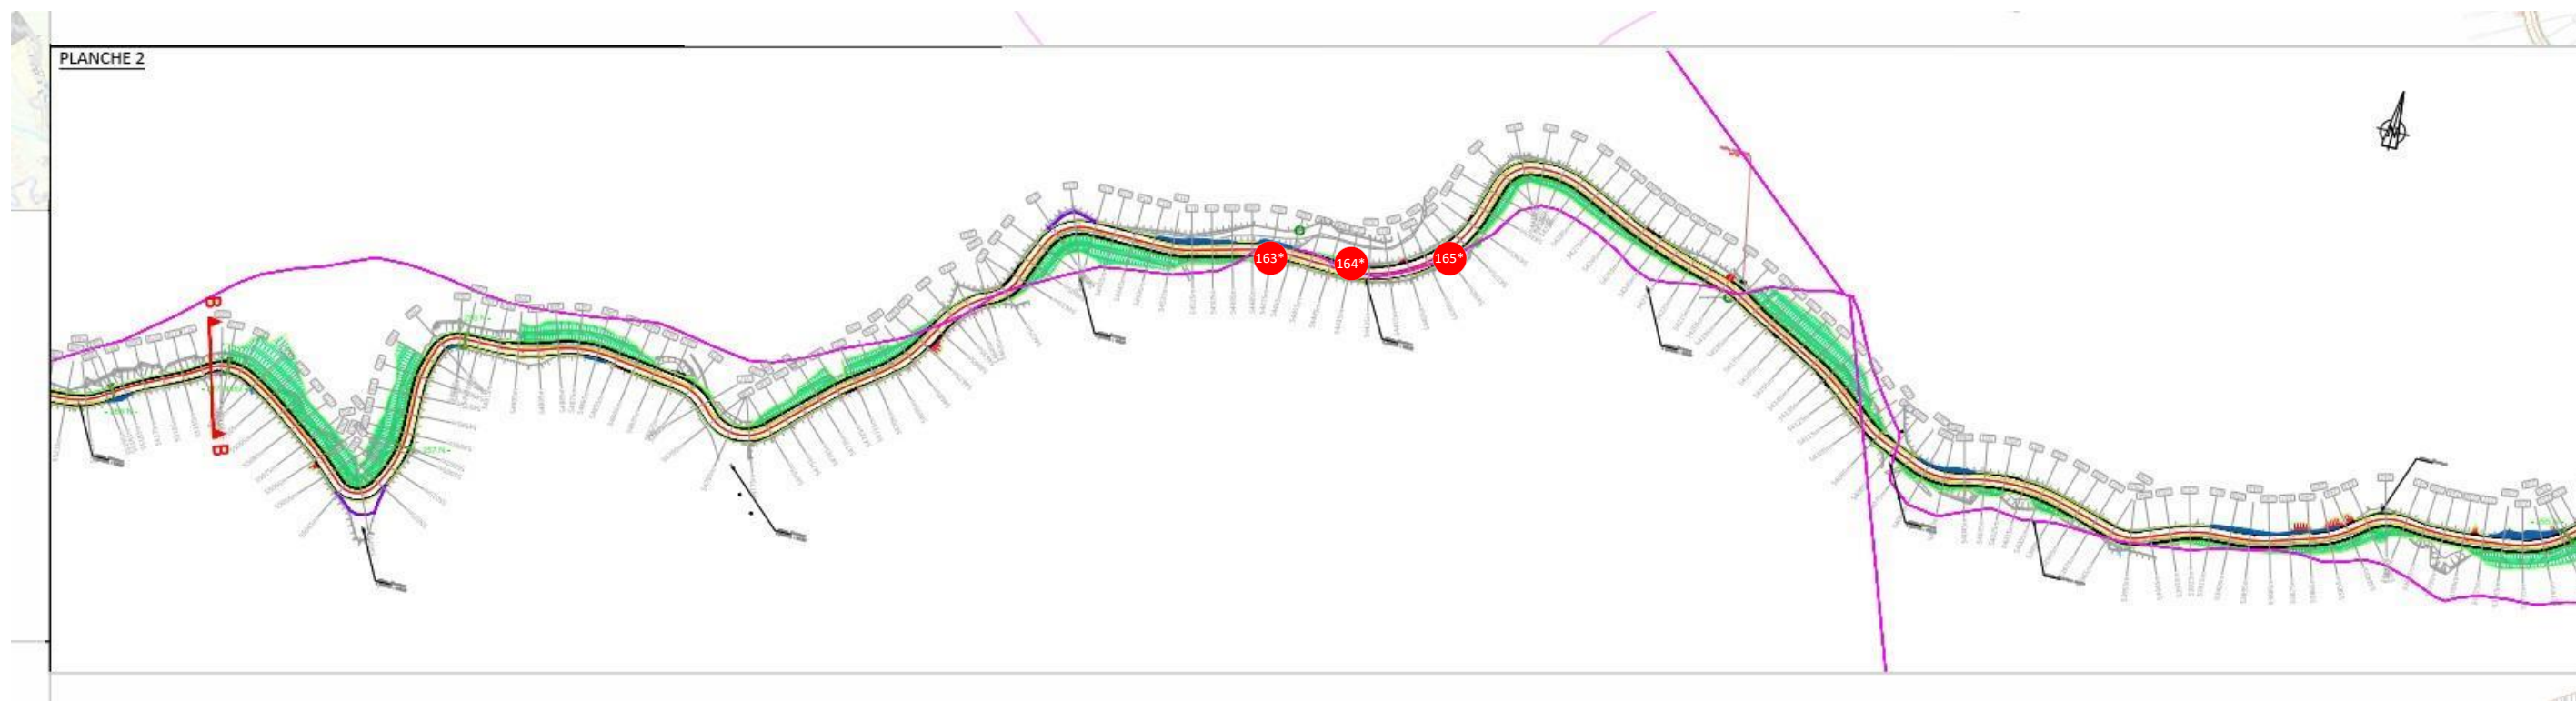

Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique / TF planche 1 - PK 52120-53725

Liste des non-conformités

N°		LOT	ENTREPRISE	INTITULÉ	DATE BUTOIR	LOCALISATION	OBSERVATIONS	ÉTAT
133	X	3 GEOTECHNICIEN		Étude complémentaire à prévoir pour élargissement	27/10/2024		P66-P65. Talus amont trop volumineux	À corriger
145		3 GEOTECHNICIEN		Épaulement ext voirie à recentrer.	22/11/2024			À corriger
162*				Cyclopéen à terminer	18/10/2024			À corriger
210*				Finir les terrassement et couche de forme de la route jusqu'au P69	08/10/2024			À corriger

Photographies des non-conformités




133

Étude complémentaire à prévoir pour élargissement

3 GEOTECHNICIEN


Date butoir : 27/10/2024

Plan - Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique / TF planche 1 - PK 52120-53725

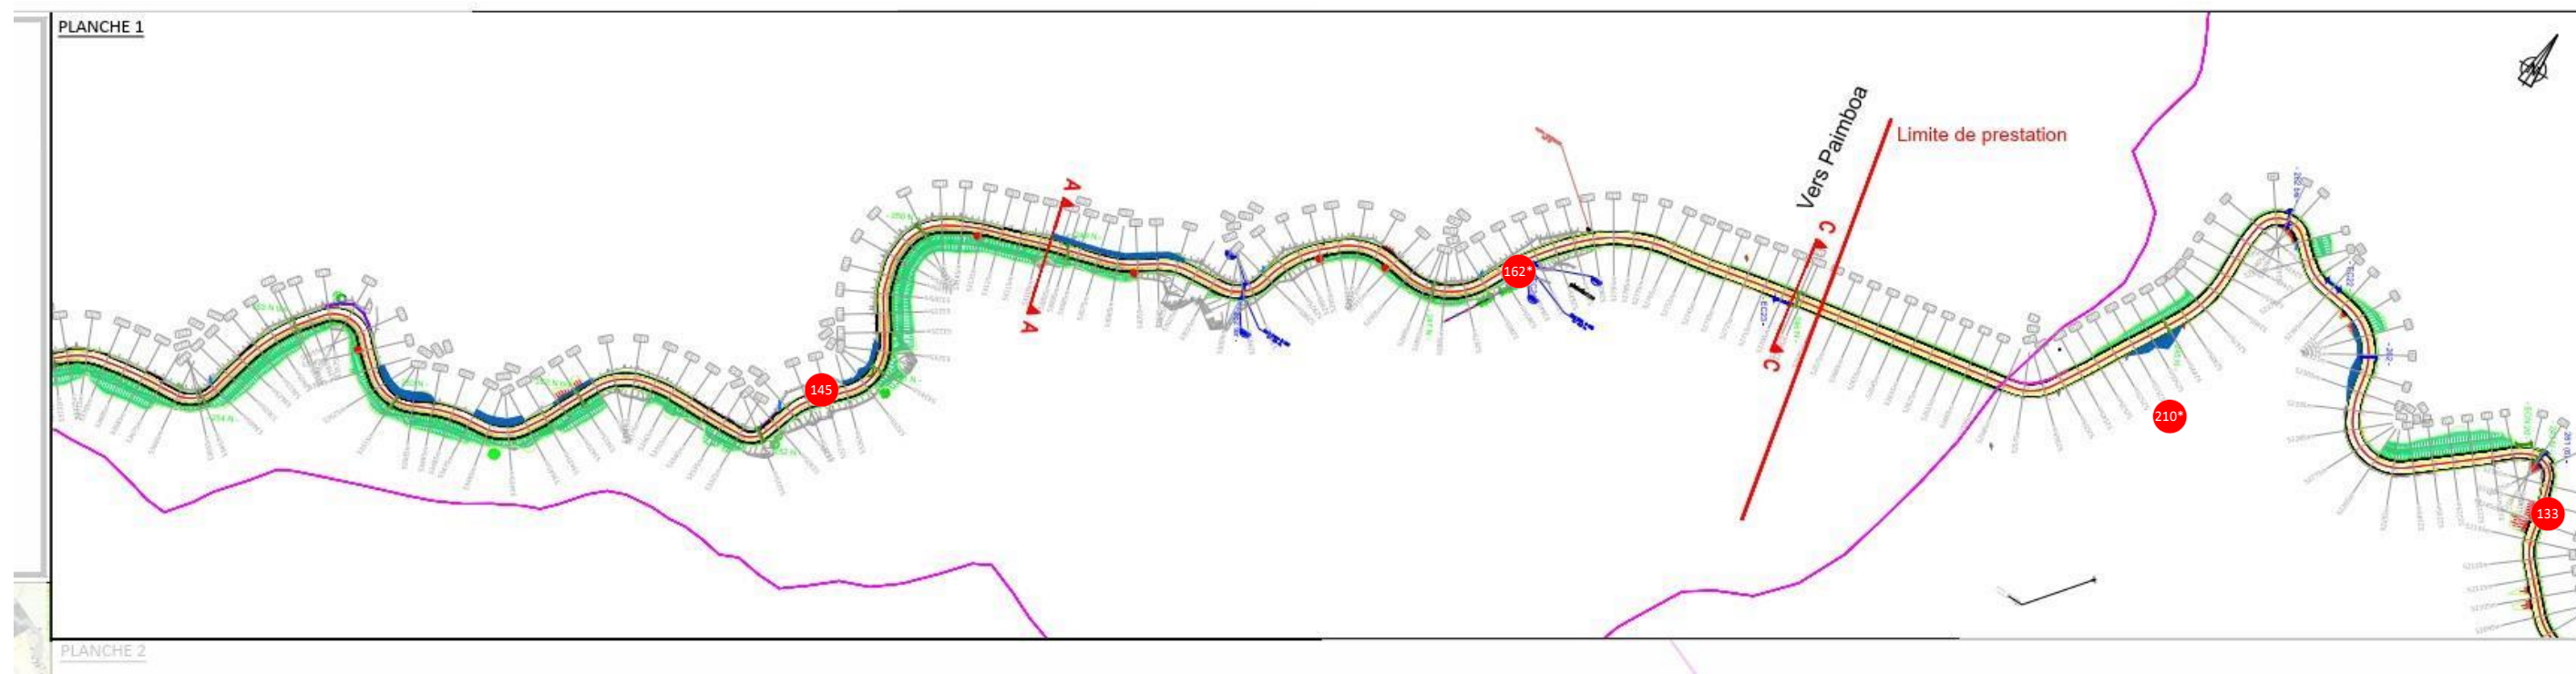


Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique / TC1.1 - PL40 - PK 58030-59610

Liste des non-conformités

N°		LOT	ENTREPRISE	INTITULÉ	DATE BUTOIR	LOCALISATION	OBSERVATIONS	ÉTAT
24		3 GEOTECHNICIEN		Avis n*5 LGC	08/10/2024			À corriger
25		3 GEOTECHNICIEN		Avis n*5 LGC	08/10/2024			À corriger
32	X	3 GEOTECHNICIEN		Avis sur enrochement	08/10/2024		Une clé a été ajoutée	À corriger
33		3 GEOTECHNICIEN		Avis sur enrochement	08/10/2024			À corriger
34	X	3 GEOTECHNICIEN		Avis sur enrochement	08/10/2024			À corriger
80		3 GEOTECHNICIEN		Avis sur talus	08/10/2024		Demande du geotechnicien	À corriger
173*				Zone en toit merlon à remplacer par une bordure	08/10/2024			À corriger
174*				Exutoire de fossé à finir	08/10/2024			À corriger
175*				Sortie tête de buse existante à bétonner	05/12/2024			À corriger
176*				Nettoyer entrée existante traversée busée et améliorer	08/10/2024		Buse existante	À corriger
177*				Descente existante à reprendre.	08/10/2024			À corriger
178*				Sortie fossé à bétonner	08/10/2024			À corriger
179*				Ravine centrale à protéger par une bordure	08/10/2024		Merlon à créer	À corriger
180*				Sortie fossé à bétonner	08/10/2024			À corriger
181*				Sortie fossé à bétonner	08/10/2024			À corriger
195*		3 GEOTECHNICIEN		Fondations d'enrochement	08/10/2024			À corriger
196*				Ravines à traiter avec des bordures et un exutoires	08/10/2024			À corriger
197*				Mission complémentaire géotechnique à faire. voir CRV5	08/10/2024	Traversée busée existante à refaire + reprise enrochement suite cavitation.		À corriger
206*		3 GEOTECHNICIEN		Talus non conforme. Voir CRV6 P823	08/10/2024			À corriger

Photographies des non-conformités



32

Avis sur enrochement

3 GEOTECHNICIEN

Date butoir : 08/10/2024



34


Avis sur enrochement

3 GEOTECHNICIEN

Date butoir : 08/10/2024

Plan - Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique / TC1.1 - PL40 - PK 58030-59610

PLANCHE 40

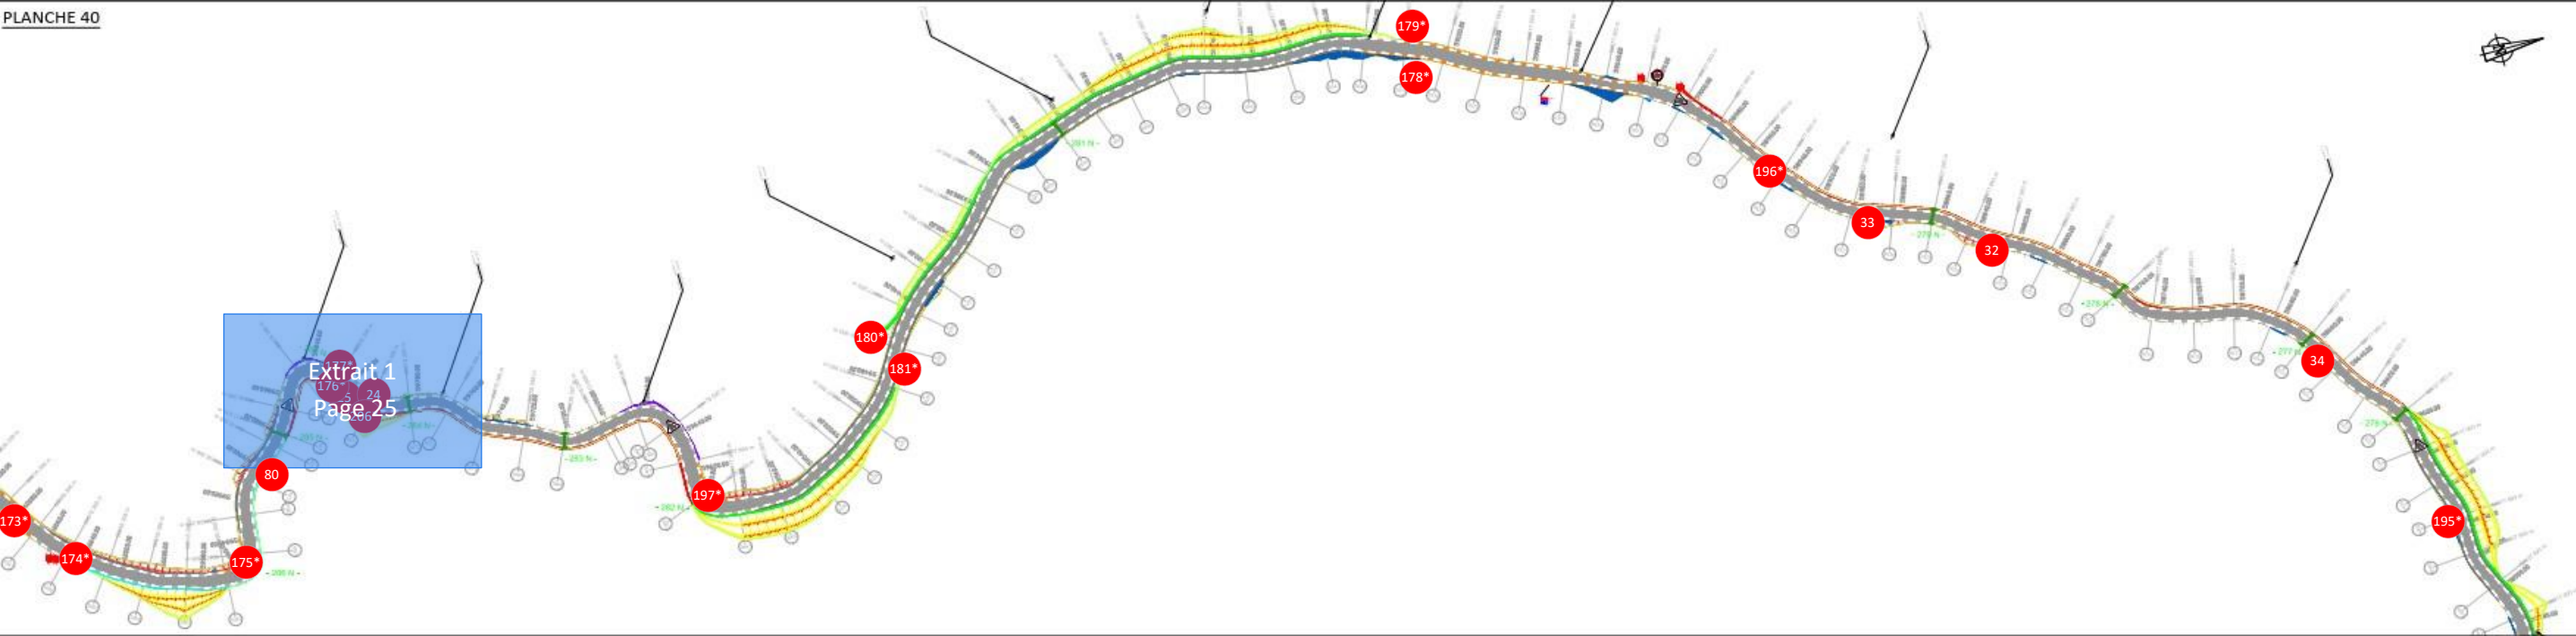

Plan - Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02 / Rapport Géotechnique /
TC1.1 - PL40 - PK 58030-59610 - Extrait 1

